

平成26・27年度 延岡大橋補修他工事 工事かわら版

地元の皆様には大変お世話になっております。延岡大橋補修外工事の現況をお知らせします。

◆現場代理人あいさつ

この度、工期が延期となり平成28年6月30日まで実施することとなりました。引き続き、安全第一で進めてまいります。何卒、御理解ご協力をよろしくお願いいたします。

現場代理人 黒木



◆工事近況レポート

皆様のご協力の元、①地震発生時に橋が落下するのを防ぐ【落橋防止装置】の取付が90%完了しました。11月より、橋の裏側に②吊足場の設置を進めており、今後、劣化部の補修を行っていきます。

また、隔流堤付近では橋脚を補強する【RC巻き立て】工事を実施するため、③隔流堤防の一部を取壊し、橋脚を巻き立てる準備をしております。

①落橋防止装置の取付



②吊足場設置



③隔流堤防の一部取壊し



◆前号～今号までのトピックス


- 7月中旬 橋脚を補強するRC巻き立て
→大瀬川側の橋脚完了
- 8月4日 橋の日清掃・草刈り活動
- 9月14日 ガード下補修に伴う片側交互通行
→ご協力ありがとうございました
- 10月14日 日向工業高校2名インターンシップ
- 📷11月12日 延岡工業高校40名現場見学会
- 11月16日～ 隔流堤の一部 全面通行止め開始
→平成28年5月31日迄の予定



📷 延岡大橋現場見学会の様子

◆工事全体工程

現在、**隔流堤防**では橋脚を補強する工事を実施する為、11月16日から来年5月31日迄**一部を終日全面通行止**にしております。期間中は自転車・歩行通行も不可能となります。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご協力お願いいたします。

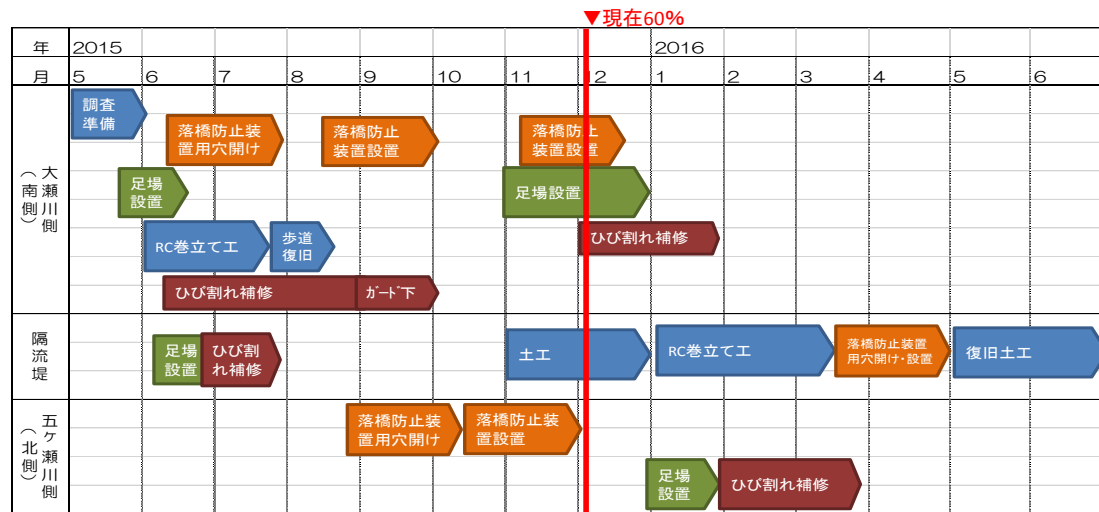

これから冬本番です！
手洗い・うがい・水分補給
湿度管理で風邪に
ならない対策を♪



今号の発行が遅くなり申し訳ございません。現場は遅れなく順調に進んでおります。
次回の発行は3月末の予定です。

発行：旭建設(株) 延岡大橋補修他作業所
工事のお問い合わせは (0982)29-2193 へ
