

平成26・27年度 延岡大橋補修他工事 工事かわら版



地元の皆様には大変お世話になっております。延岡大橋補修外工事の現況をお知らせします。

◆現場代理人あいさつ

工事期間が平成28年6月30日迄、残り2ヶ月を切りました。皆様には隔流堤の通行止め等でご迷惑をお掛けしております。安全第一・早期完成を目指して進めてまいりますので、ご理解・ご協力よろしくお願いいたします。現場代理人 黒木



◆工事近況レポート

皆様のご協力の元、前号でご紹介しました橋のひび割れ等の【劣化部の補修】、既存の橋脚を鉄筋とコンクリートで補強する【RC巻き立て】が無事完了となりました。現在、RC巻き立てに伴い掘削・取壊しを行った隔流堤の【復旧工事】を実施しております。工事は、掘削箇所の埋戻し、護岸ブロックの設置、舗装等を行います。

①劣化部の補修



②RC巻き立て・復旧工事



◆前号～今号までのトピックス


- 📷 11月～3月 延岡大橋に吊足場設置、【劣化部の補修】を開始⇒3月完了
- 11月16日 隔流堤の一部通行止め開始 →橋脚周りを掘削(土工)開始
- 1月～2月 橋脚を補強する【RC巻き立て】を開始⇒2月完了
- 3月～ 掘削した隔流堤の一部を元通りにする【復旧工事】を開始⇒現在進行中



📷 吊足場設置の様子(12月頃)

◆工事全体工程

平成28年3月末時点で進捗率90%となりました。隔流堤では引続き平成28年5月31日迄一部を終日全面通行止にしております。期間中は自転車・歩行通行も不可となります。ご不便をおかけいたしますが、ご協力お願いいたします。

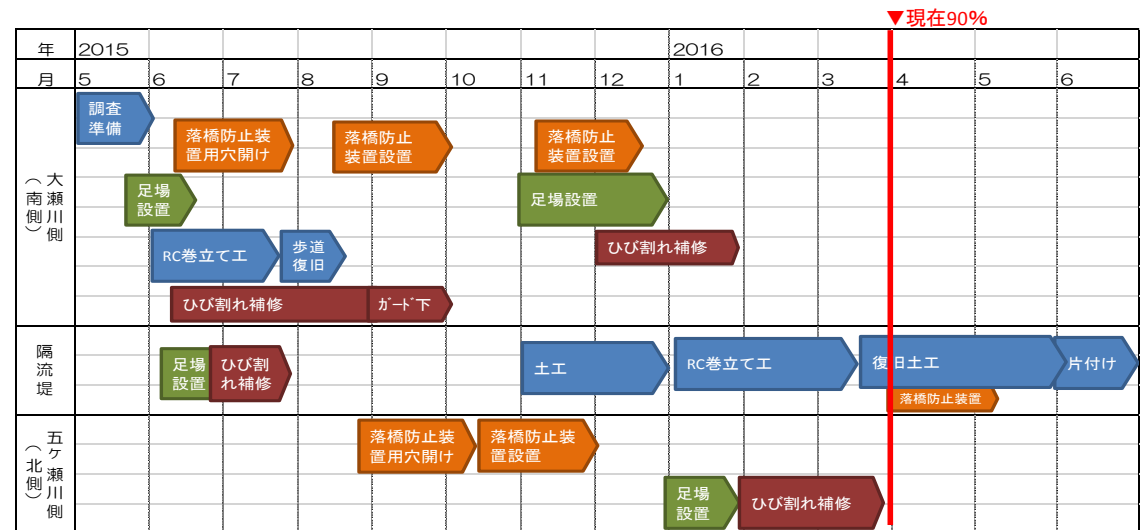

今年、宮崎の桜開花は、昨年より4日遅れたとのこと。現場事務所を構えております。妙田緑地公園の桜もまばらな開花となり、綺麗な満開を迎え、静かな春となりました。

次号が最終号となります。現場の様子や工事かわら版は弊社ホームページ「現場日記」からもご覧いただけます。最終号は6月末の発行予定です。

発行：旭建設(株) 延岡大橋補修他作業所
工事のお問い合わせは (0982)29-2193

